

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

TERCER INFORME TRIMESTRAL

EN ESTE TERCER TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2023, SE HAN DESARROLLADO 03 PROYECTOS, CORRESPONDIENTES A 06 PROGRAMAS PRESUPUESTALES, LOS CUALES SON: 12.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO, 23.- INFRAESTRUCTURA URBANA, 24.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, 25.- INFRAESTRUCTURA PARA SANEAAMIENTO BÁSICO, 26.- AGUA POTABLE PARA TODOS Y TODAS. TODO ESTO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE TRABAJO CONVOCADO EN RESPUESTA A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023. Y ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDMS), EJERCICIO FISCAL 2023.

22. Vigilancia, seguimiento y control de obra pública

FIN

Contribuir al fortalecimiento de la vigilancia de los procesos de calidad de la obra pública

PROPOSITO

La población del municipio se beneficia con la vigilancia y control de la obra pública que se lleva a cabo

COMPONENTE 1

Gastos indirectos para la verificación y seguimiento correcto de las obras aplicados

ACTIVIDAD 1.1

Construcción del proceso de vigilancia de la obra pública

COMPONENTE 2

Obra pública bajo el servicio de vigilancia, inspección y control realizada implementadas

ACTIVIDAD 2.1

Elaboración de procesos de gestión de la obra pública

ACTIVIDAD 2.2

Organización de las unidades ejecutoras de la obra pública

COMPONENTE 3

Obra pública bajo el diseño de un sistema de aseguramiento de la calidad del ciclo de

proyectos realizada

ACTIVIDAD 3.1

Elaboración de procesos de calidad del ciclo del proyecto

ACTIVIDAD 3.2

Implementación del proceso de calidad del ciclo del proyecto

• **Se Anexa Programa Anual 2023**

- **Se anexa el Acta de Priorización de Obras y Proyectos del Consejo de Desarrollo Municipal (CDMS), Ejercicio Fiscal 2023.**

- **RELACIÓN DE OBRAS REVISADAS CON S.O.A.P.A.**
- **RELACIÓN DE OBRAS VISITADAS PARA LA LICITACIÓN**
- **RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO DE SUPERVISIÓN**


- OBRAS REVISADAS TÉCNICAMENTE CON PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DENOMINADO: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA S.O.A.P.A.

22.- VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2023 - 2024





Oaxaca de Juárez
2023 - 2024
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 29 de Agosto de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

Nombre de la obra y/o tema:	"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE."
Número de la Obra:	FIII/025/2022
Contratista:	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.
Administrador Único:	C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO
Problemas y/o Asunto:	REVISIÓN FÍSICA CON PERSONAL OPERATIVO DE S.O.A.P.A.


SE LLEVO ACABO UN RECORRIDO Y REVISIÓN FÍSICA DONDE SE REALIZO LO SIGUIENTE:

- REVISIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 45 CMS. DE DIÁMETRO (TRAMO CALLE 5 DE FEBRERO A CALLE ARTICULO 123) E INTERCONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES.
- LEVANTAMIENTO DE LONGITUDES Y PROFUNDIDADES ENTRE POZO Y POZO.
- REVISIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTE Y NUEVOS.
- ESPEJO DE LA TUBERÍA COLOCADA DE 45 CMS. DE DIÁMETRO Y DESCARGAS SANITARIAS.



Revisión física de pozos de visita Calle Plan de Ayala.

22-Agosto-2023

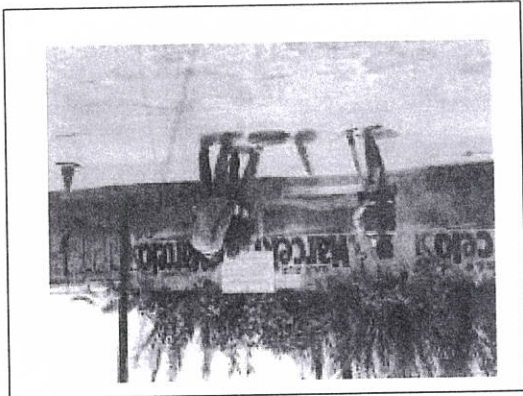


Espejo la tubería instalada y descargas.

29-Agosto-2023

ARO. AURORA REYES BAUTISTA.
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento



Oaxaca de Juárez

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

TARJETA INFORMATIVA


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 29 de Agosto de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

Nombre de la obra y/o tema:	"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES, CALLE PROLONGACIÓN DE ARTEAGA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 16 DE SEPTIEMBRE."
Número de la Obra:	FIII/030/2022
Contratista:	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.
Administrador Único:	C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO
Problemáticas y/o Asunto:	REVISIÓN FÍSICA CON PERSONAL OPERATIVO DE S.O.A.P.A.


SE LLEVO ACABO UN RECORRIDO Y REVISIÓN FÍSICA DONDE SE REALIZO LO SIGUIENTE:

- REVISIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS. DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES.
- LEVANTAMIENTO DE LONGITUDES Y PROFUNDIDADES ENTRE POZO Y POZO.
- ESPEJO DE LA TUBERÍA COLOCADA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO Y DESCARGAS SANITARIAS.
- REVISIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTE Y NUEVOS.

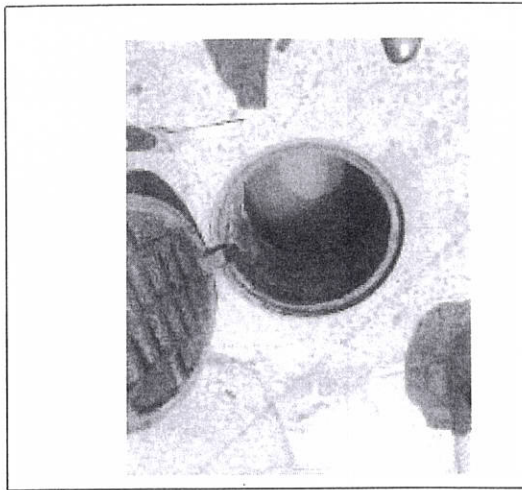

Espejo la tubería instalada y descargas.

29-Agosto-2023

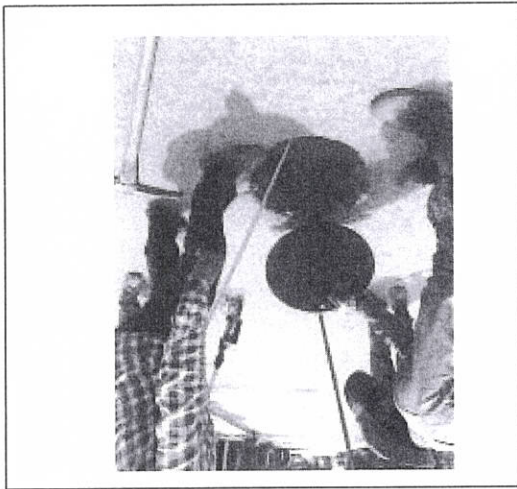

Revisión física de pozos de visita Prolongación Arteaga.

22-Agosto-2023

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA.
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento



Oaxaca de Juárez
Foro de la cultura de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".



TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 23 de Agosto del 2023

Nombre de la obra y/o tema:	"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA MONTE ALBÁN, CALLE PITAXOO."
Ubicación:	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM.
Problemáticas y/o Asunto:	REVISIÓN TÉCNICA CON PERSONAL DE SOAPA.

EN LA CUAL SE REALIZO LO SIGUIENTE:

- REVISION DE INSTALACION DE TUBERIA DE 30 CMS. DE DIAMETRO, INTERCONEXION A POZO EXISTENTE.
- REVISION DE POZOS DE VISITA EXISTENTES.
- ESPEJO DE LA TUBERIA COLOCADA DE 30 CMS. DE DIAMETRO.
- REVISION DE DESCARGAS SANITARIAS.

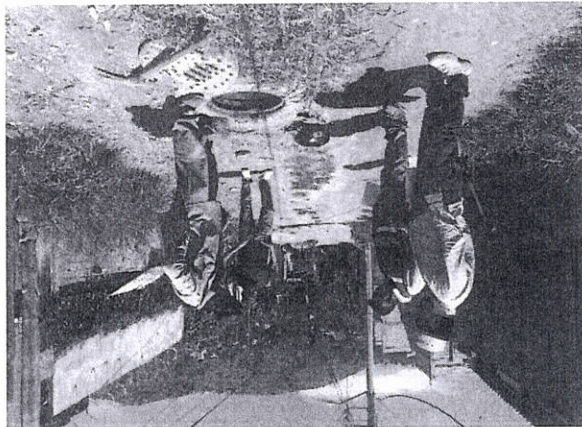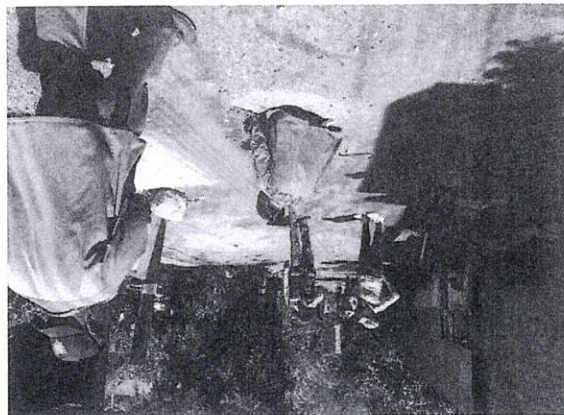

ARO. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano

Plazuela Vicente Guerrero núm.105, colonia Ex Marquésado, C.P. 68030, Oaxaca de Juárez, Oax. (951) 5151352-5152231

www.municipioidexaxaca.gob.mx

f w @ o d



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".


TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 24 de Agosto del 2023

Nombre de la obra y/o tema:	"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CASCO DE LA AGENCIA CALLE CAMINO NACIONAL".
Numero de obra:	EIII/103/2022
Contratista:	"INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V."
Ubicación:	AGENCIA MUNICIPAL SANTA ROSA PANZACOLA.
Problemas y/o Asunto:	REVISIÓN TÉCNICA CON PERSONAL DE SOAPA.

EN LA CUAL SE REALIZO LO SIGUIENTE:

- REVISION DE INSTALACION DE TUBERÍA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES.
- REVISION DE POZOS DE VISITA EXISTENTES.
- ESPEJO DE LA TUBERÍA COLOCADA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO.
- REVISION DE DESCARGAS SANITARIAS.

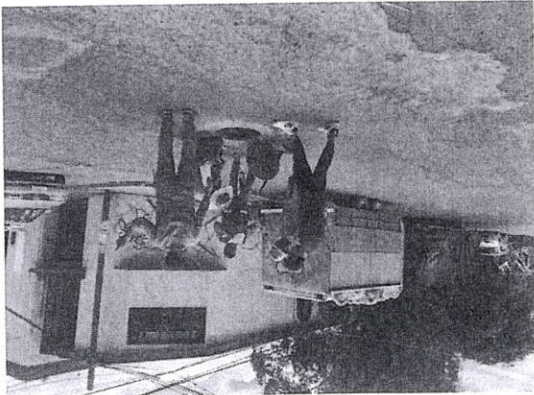

ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano




Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 23 de Agosto del 2023

Nombre de la obra y/o tema:	"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA LAZARO CÁRDENAS CALLES PLUTARCO ELÍAS CALLES, ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS."
Ubicación:	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM.
Problemáticas y/o Asunto:	REVISIÓN TÉCNICA CON PERSONAL DE SOAPA.

EN LA CUAL SE REALIZO LO SIGUIENTE:

- REVISION DE INSTALACION DE TUBERIA DE 30 Y 45 CMS. DE DIAMETRO, A INTERCONEXION A POZOS EXISTENTES.
- REVISION DE POZOS DE VISITA EXISTENTES.
- ESPEJO DE LA TUBERIA COLOCADA DE 30 Y 45 CMS. DE DIAMETRO.
- REVISION DE DESCARGAS SANITARIAS.

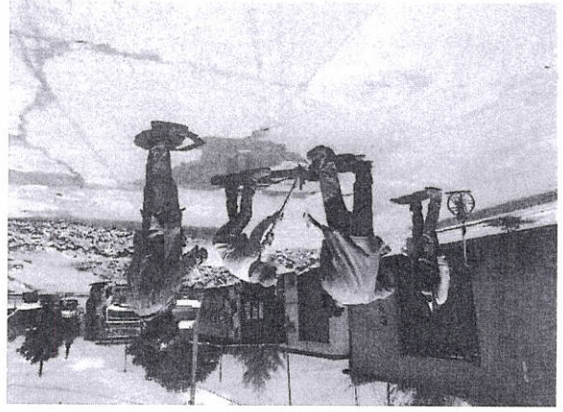

ARG. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano



Oaxaca de Juárez

2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD

TARJETA INFORMATIVA


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 29 de Agosto de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

Nombre de la obra	"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES, CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y 21 DE MARZO."
y/o tema:	
Número de la Obra:	FIII/065/2022
Contratista:	ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Administrador Único:	C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT
Problemáticas y/o Asunto:	REVISIÓN FÍSICA CON PERSONAL OPERATIVO DE S.O.A.P.A.

SE LLEVO ACABO UN RECORRIDO Y REVISIÓN FÍSICA DONDE SE REALIZO LO SIGUIENTE:

- LEVANTAMIENTO DE LONGITUDES Y PROFUNDIDADES ENTRE POZO Y POZO.
- REVISIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS. DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES.
- REVISIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES.
- ESPEJO DE LA TUBERÍA COLOCADA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO Y DESCARGAS SANITARIAS.

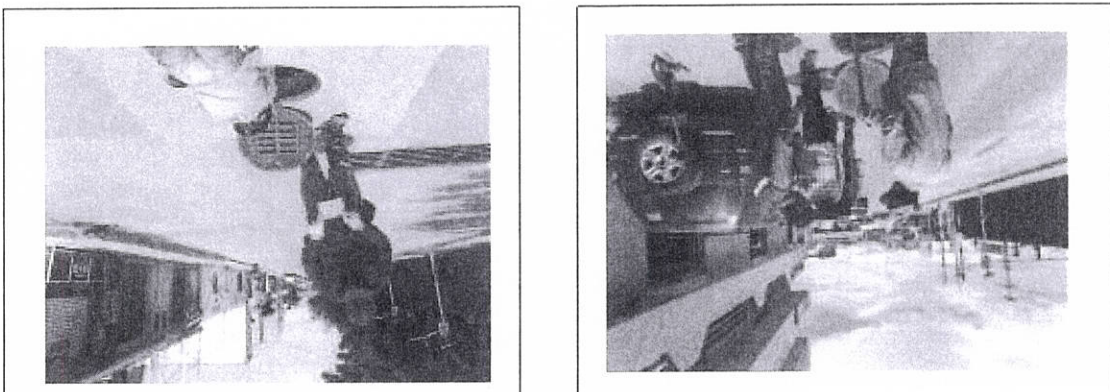

Revisión física de pozos de visita calle Reforma Agraria. 22-Agosto-2023	Espejo la tubería instalada y descargas. 29-Agosto-2023
---	--

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA.
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento



Oaxaca de Juárez
"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"
TARJETA INFORMATIVA


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 29 de Agosto de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

Nombre de la obra	"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES CALLE PLAN DE AYALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y REFORMA AGRARIA."
y/o tema:	FIII/076/2022
Número de la Obra:	ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Contratista:	C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT
Administrador Único:	REVISIÓN FÍSICA CON PERSONAL OPERATIVO DE S.O.A.P.A.
Problemáticas y/o Asunto:	

SE LLEVO ACABO UN RECORRIDO Y REVISIÓN FÍSICA DONDE SE REALIZO LO SIGUIENTE:

- REVISIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS. DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES.
- LEVANTAMIENTO DE LONGITUDES Y PROFUNDIDADES ENTRE POZO Y POZO.
- REVISIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTE Y NUEVOS.
- ESPEJO DE LA TUBERÍA COLOCADA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO Y DESCARGAS SANITARIAS.

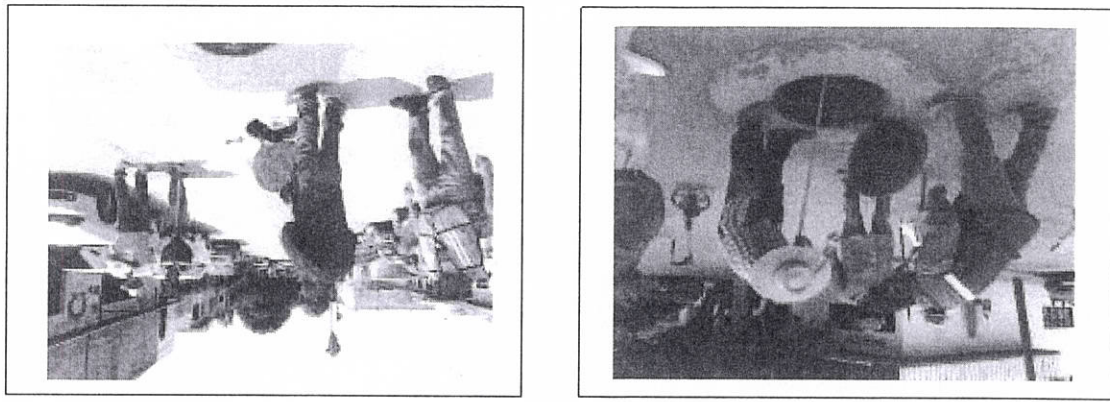

Revisión física de pozos de visita Calle Plan de Ayala. 22-Agosto-2023	Espejo la tubería instalada y descargas. 29-Agosto-2023
---	--

ARQ. KUDORA REYES BAUTISTA.
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

• OBRAS VISITADAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".



RELACION DE OBRAS VISITADAS PARA LA LICITACION PÚBLICA.

FIJI/002/2023.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/004/2023.- CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/006/2023.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/007/2023.- REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/009/2023.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/010/2023.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES BENITO JUÁREZ Y REFORMA, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/011/2023.- REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE SEXTA ORIENTE, COLONIA CUAHUTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de agosto de 2023

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E


Nombre de la obra y/o tema:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA".
Ubicación:	CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO.
Problemáticas y/o Asunto:	VISITA DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/SOPDL/DCSCOP/006/2023.

Se llevo a cabo una visita y recorrido físico al sitio de la obra donde se realizaron las siguientes actividades:

- Lectura del Catálogo de Conceptos a los Contratistas Participantes.
- Recorrido de la Calle Privada de Constituyentes, en compañía del Personal Técnico del Área de Proyectos, Órgano Interno de Control, Empresas Licitantes, así como también el acompañamiento por parte de la Agente Municipal de Pueblo Nuevo y los vecinos de la Calle Privada de Constituyentes.



Lectura del Catálogo de Obra a los Asistentes.

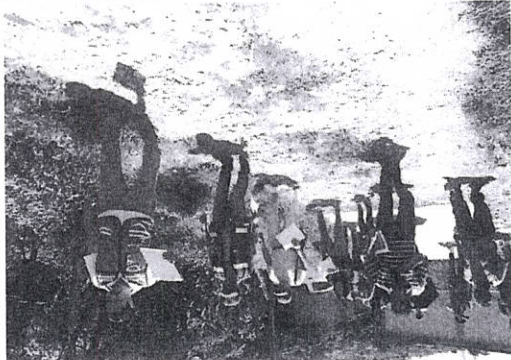


Recorrido en la Calle Privada de Constituyentes.

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras

Públicas y Desarrollo Urbano



"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de Agosto de 2023.


A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

Nombre de la obra	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA."
Ubicación:	CALLE LA ERA, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI
Problemáticas y/o Asunto:	VISITA DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/SOPDU/DCSCOP/008/2023.

SE LLEVO ACABO UNA VISITA Y RECORRIDO FISICO AL SITIO DE LA OBRA DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- LECTURA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS A LAS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
- RECORRIDO DE CALLE LA ERA, EN COMPAÑIA DEL PERSONAL TECNICO DEL AREA DE PROYECTOS, ORGANO

INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Y EMPRESAS LICITANTES.

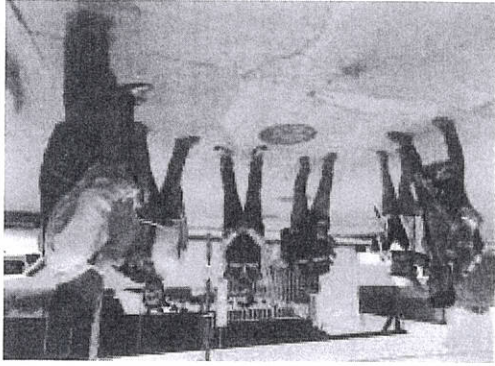	
Lectura de catálogo de obra a los asistentes.	Recorrido en la calle La Era Agencia Candián.

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA.
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento



Oaxaca de Juárez
2023 - 2024
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

TARJETA INFORMATIVA


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de Agosto de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

Nombre de la obra	"REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA."
Ubicación:	CALLE LA ERA, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI
Problemáticas y/o Asunto:	VISITA DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/SOPDU/DCSCOP/008/2023.

SE LLEVO ACABO UNA VISITA Y RECORRIDO FISICO AL SITIO DE LA OBRA DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- LECTURA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS A LAS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
- RECORRIDO DE CALLE LA ERA, EN COMPANIA DEL PERSONAL TECNICO DEL AREA DE PROYECTOS, ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Y EMPRESAS LICITANTES.

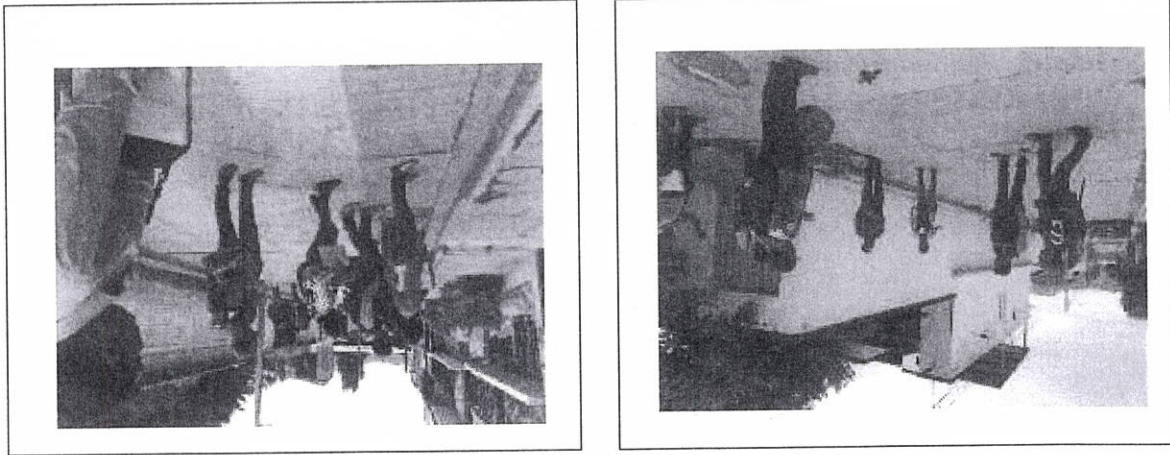

Panorámica de asistentes a la Visita de obra.
Recorrido en la calle La Era Agencia Candiani.

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA.
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

Plazuela Vicente Guerrero número 5, colonia Ex Marquésado, C.P. 68030, Oaxaca de Juárez, Oax.
(951) 5151351- 5152231



www.municipiooaxaca.gob.mx



Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 11 de agosto de 2023.

Nombre de la obra y/o tema:	"Construcción de red de agua potable, calles Benito Juárez y Reforma, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"
Ubicación:	Agencia de Policía de San Luis Beltrán, calles Benito Juárez y Reforma
Probleáticas y/o asunto:	Construcción de red de agua potable

Se realizó la visita de obra conforme a la Licitación Pública Estatal No. LPE/SOPDU/DCSCOP/001/2023, conjuntamente con personal del Órgano Interno de Control y del Departamento de Proyectos, asistiendo tres contratistas participantes; se recorrió la obra de acuerdo al proyecto ejecutivo licitado, se leyó cada uno de los conceptos que integran el catálogo de obra, preguntando a los asistentes si tenían algún comentario que hacer al proyecto y/o al catálogo de obra, nadie hizo alguna observación.

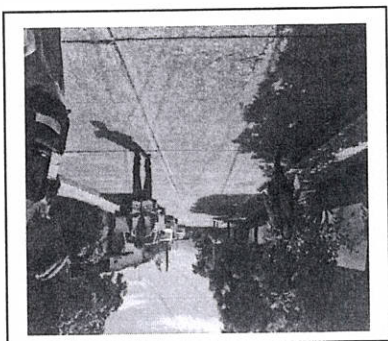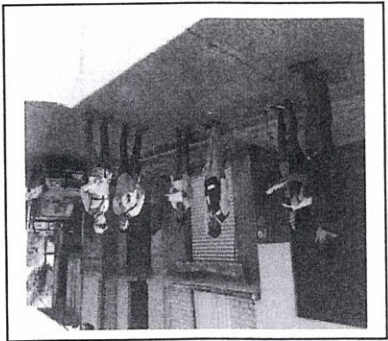

Registro de reconocimiento de la calle Reforma con contratistas y personal del Departamento de Proyectos y Órgano Interno de Control.

Registro de reconocimiento de la calle Benito Juárez con contratistas y personal del Departamento de Proyectos y Órgano Interno de Control.

Explicación técnica de la obra por parte del personal del Departamento de Proyectos.

Arq. Juan Eduardo Franco Silva
Residente de obra

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento




Oaxaca de Juárez
Instituto Cultural de la Hermandad
2022 - 2024
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"
TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 11 de agosto de 2023.


Nombre de la obra y/o tema:	"Construcción de tanque de agua potable, calle Alvaro Obregón, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"
Ubicación:	Agencia Municipal de Donají, calle Alvaro Obregón
Problemas y/o asunto:	Construcción de tanque de agua potable

Se realizó la visita de obra para la licitación No. 002, conjuntamente con personal del Órgano Interno de Control y del Departamento de Proyectos, asistiendo cuatro contratistas participantes; se recorrió la obra de acuerdo al proyecto ejecutivo licitado, se leyó cada uno de los conceptos que integran el catálogo de obra, preguntando a los asistentes si tenían algún comentario que hacer al proyecto y/o al catálogo de obra, nadie hizo alguna observación.

ARO. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE

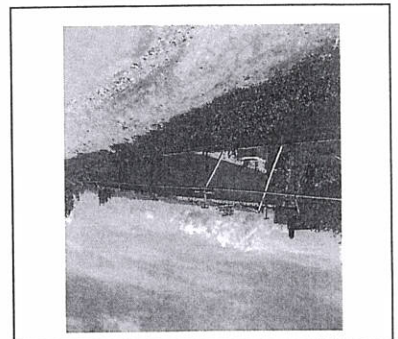

Vista de la cerrada de Antonio de León

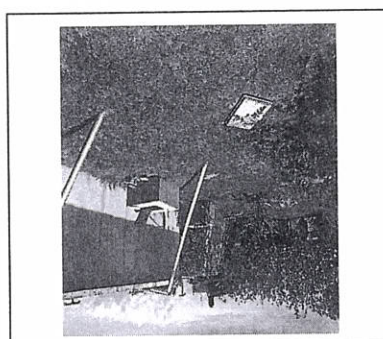

Vista de la calle Juan de la Barrera



Vista de la calle Felipe Angeles

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

TARJETA INFORMATIVA


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de agosto de 2023

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E


Nombre de la obra y/o tema:	"CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
Ubicación:	CALLE SAUCES, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA.
Problemáticas y/o Asunto:	VISITA DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/SOPDL/DCSCOP/007/2023.

Se llevo a cabo una visita y recorrido físico al sitio de la obra donde se realizaron las siguientes actividades:

- Lectura del Catálogo de Conceptos a los Contratistas Participantes.
- Recorrido de la Calle Sauces, en compañía del Personal Técnico del Área de Proyectos, Órgano Interno de Control, Empresas Licitantes, así como también el acompañamiento por un representante por parte de la Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola y l vecinos de la Calle Sauces.

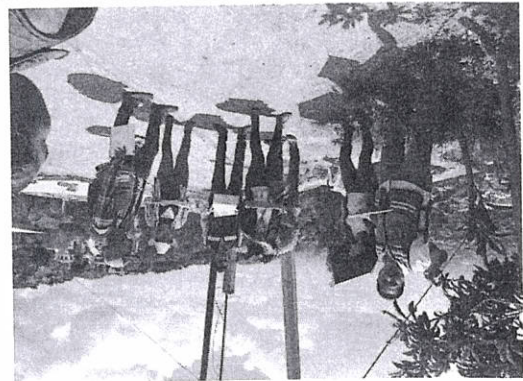

Lectura del Catálogo de Obra a los Asistentes.

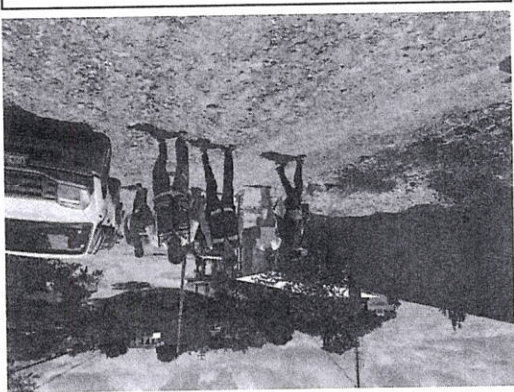

Recorrido en la Calle de Sauces.

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano

Oaxaca de Juárez

2022 - 2024

Proyecto Cultural de la Interculturalidad

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"




TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 11 de agosto de 2023.

Nombre de la obra y/o tema:	"Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, Cerrada de Antonio de León, Privada Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Angeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"
Ubicación:	Sector 4, Agencia Guadalupe Victoria
Problemáticas y/o asunto:	Construcción de línea de drenaje sanitario

Se realizó la visita de obra para la licitación No. 003, conjuntamente con personal del Órgano Interno de Control y del Departamento de Proyectos, asistiendo únicamente un contratista participante; se recorrió la obra de acuerdo al proyecto ejecutivo licitado, se leyó cada uno de los conceptos que integran el catálogo de obra, preguntando a los asistentes si tenían algún comentario que hacer al proyecto y/o al catálogo de obra, nadie hizo alguna observación.

ARO. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE

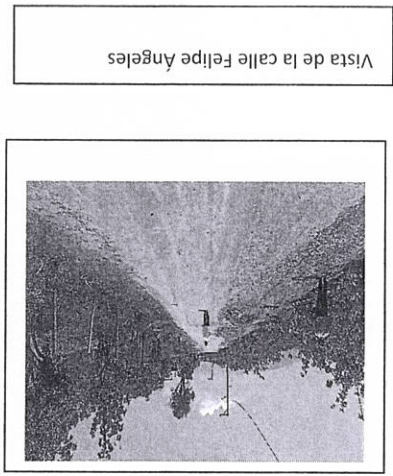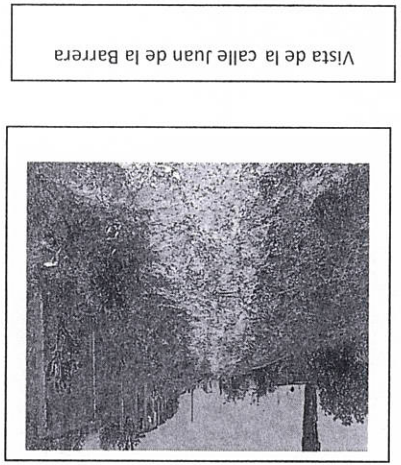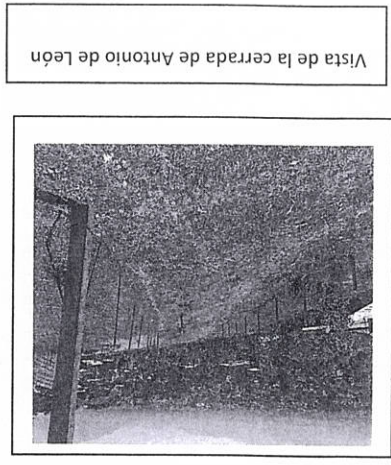



TARJETA INFORMATIVA


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de Agosto de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE


Nombre de la obra y/o tema:	"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES NUEVO MÉXICO, 4A, 5A, 6A, Y 7A. PRIVADA DE NUEVO MÉXICO, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA".
Ubicación:	CALLES NUEVO MÉXICO, 4A, 5A, 6A, Y 7A. PRIVADA DE NUEVO MÉXICO, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO.
Problemáticas y/o Asunto:	VISITA DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/SOPDU/DCSCOP/005/2023.

SE LLEVO ACABO UNA VISITA Y RECORRIDO FISICO AL SITIO DE LA OBRA DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- LECTURA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS A LAS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
- RECORRIDO DE CALLE LA ERA, EN COMPANIA DEL PERSONAL TECNICO DEL AREA DE PROYECTOS, ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Y EMPRESAS LICITANTES.

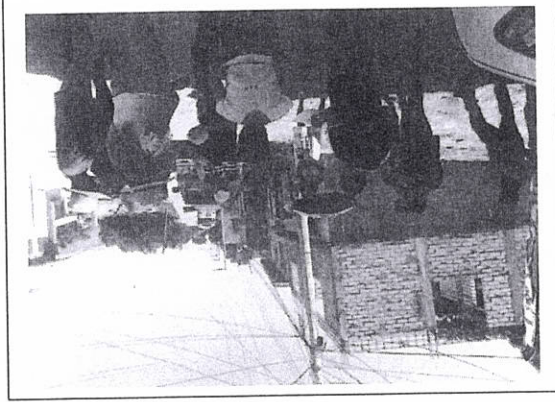

Lectura de catálogo de obra a los asistentes.

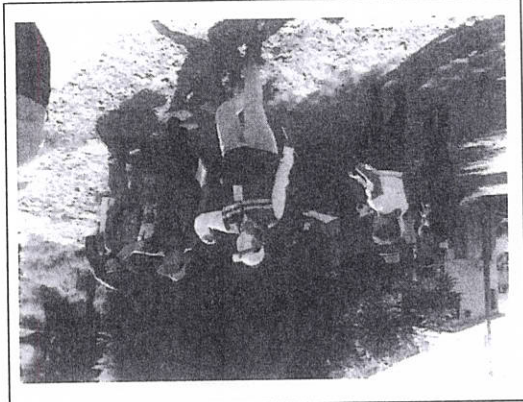

Recorrido en la calle Calles Nuevo México Colonia los Angeles.

ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO.
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

22.- VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

- OBRAS RAMO 33 FONDO III EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SUPERVISADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

**RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS, EN PROCESO DE EJECUCIÓN,
SUPERVISADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO.**

FIJI/002/2023.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/004/2023.- CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/006/2023.- REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/007/2023.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LA ERA, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/009/2023.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

FIJI/010/2023.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES BENITO JUÁREZ Y REFORMA, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

Plazuela Vicente Guerrero número 5, colonia Ex Marquesado, C.P. 68030, Oaxaca de Juárez, Oax. (951) 5151352-5152231

www.municipiodeoaxaca.gob.mx




“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”
REPORTE DE AVANCE

28 de septiembre de 2023

NOMBRE DE LA OBRA:		No. DE OBRA:		FONTE		FONDO:		FINALIDAD:		FUNCION:		SUBFUNCION:		OFICIO		APROBACION:		DE FECHA:		MODALIDAD		EJECUCION:		CONTRATO:		EMPRESA:		PERIODO		CONTRATO:		AVANCE FISICO:	
"Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera, cerrada Antonio de León, privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Angeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"		FIII/002/2023		Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el ejercicio fiscal 2023"		Fondo III "Fondo para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"		2. Desarrollo Social.		2.1. Protección ambiental		2.1.3. Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.		FISMD/002/2023		DE		11 de julio de 2023		Contrato		DCSYCOP/FIII 002/2023		DE FECHA: 01 de septiembre de 2023		"Servicios Integral ASLOR, S.A. de C.V."		02 de septiembre de 2023 al 23 de diciembre de 2023		DE		06 %	



Excavación en roca, cerrada Antonio de León, PV-7 a PV-10 y PV10 a PV-11

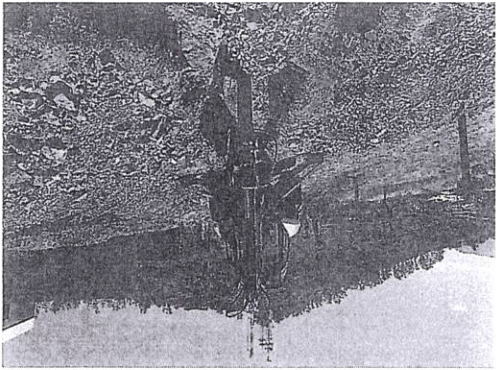

Excavación en roca, cerrada Antonio de León, PV10 a PV-11

Arg. Alejandro Elias Velasco Alcantara
Residente de Obra

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

ET-01

EXPEDIENTE TÉCNICO

EJERCICIO:	2023
ESTADO:	020 OAXACA
REGIÓN:	08 VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19 CENTRO
MUNICIPIO:	067 OAXACA DE JUAREZ
LOCALIDAD:	0501 AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES JUAN DE LA BARRERA, FELIPE ANGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RAMO:	RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)
FONDO:	FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 2.01 A 4.00 MTS, PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 CMS, (8"), POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE FO.FO. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.00 A 1.25 M, DE DIÁMETRO INTERIOR, POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE FO.FO. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.26 A 1.50 M, DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS, Y HASTA UNA ALTURA DE 50 CMS, POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE FO.FO. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.76 A 2.00 M, DE DIÁMETRO INTERIOR, POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE FO.FO. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 2.01 A 2.25 M, DE DIÁMETRO INTERIOR, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURDO DE TABICÓN DE 28 CMS, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ATRAQUE DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO F.C.=150 KG/CM2, DE 60 X 65 X 60 CMS, ENCOFRADO DE TUBERÍA DE PLÁSTICO Y/O CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO, DE 60 X 60 CMS DE SECCIÓN, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE.

C. EUSTORGIO CAMPO SALINAS	DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENZUELA	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AUTORIZA	Vo.Bo.

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2023

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

I.- UBICACIÓN		CLAVE		NOMBRE	
Estado:	020	OAXACA			
Región:	08	VALLES CENTRALES			
Distrito:	19	CENTRO			
Municipio:	067	OAXACA DE JUÁREZ			
Localidad:	0501	AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA			
Tipo de Localidad:		CP ()		PR ()	ZI () ZU (X)

II.- IDENTIFICACIÓN

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL	NOMBRE
FUNCIÓN:	2.1	PROTECCION AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

Situación de la obra:

Inicio () Inicio-Término (X) Continuación () Término ()

Modalidad de la ejecución:

C (X) AD ()

III.- METAS

Unidad de Medida:

ML	Totales del Proyecto	462.13
	Totales del Ejercicio	462.13

% Avance Físico Acumulado al 31/12/2022

0.00%

% Avance Físico Programado al 31/12/2023

100%

Fecha Programada de Inicio:

AGOSTO DEL 2023

Fecha Programada de Término

OCTUBRE DEL 2023

Nº de Jornales a generar:

410.76

Nº de Beneficiarios:

180

Tipo de Beneficiarios

PERSONAS


Nº de Beneficiarios Mujeres:

94



Nº de Beneficiarios Hombres:

86

DETALLE CAJA DE CAIDA ADOSADA


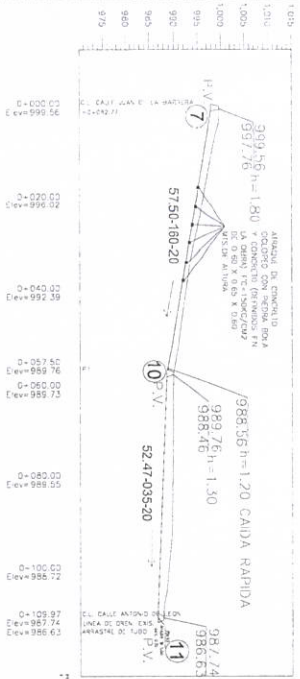


DETALLE POZO DE VISTA TRANSICION P.V.(8)

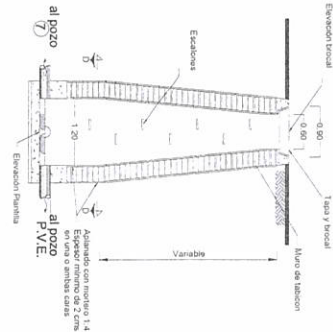


- 1.- TUBERIA SANITARIA
- 2.- Muro de tabicon pesado de medidas comerciales, de 28 cms. de espesor.
- 3.- Mediacaña elaborada con concreto Fc-200 Kg/cm², elaborada sobre plantilla de concreto de 20 cms de espesor elaborada con concreto Fc-200 Kg/cm².


PERFIL CERRADA ANTONIO DE LEON

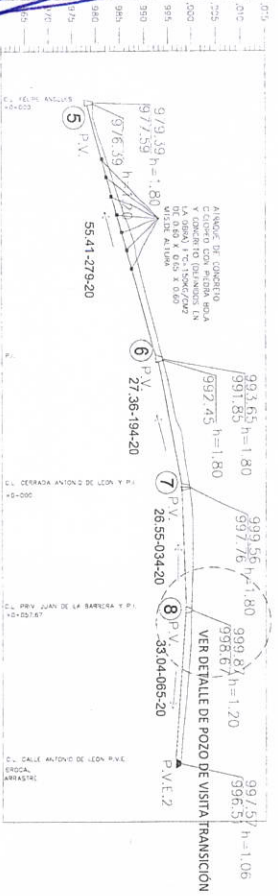


PERFIL CALLE JUAN DE LA BARRERA

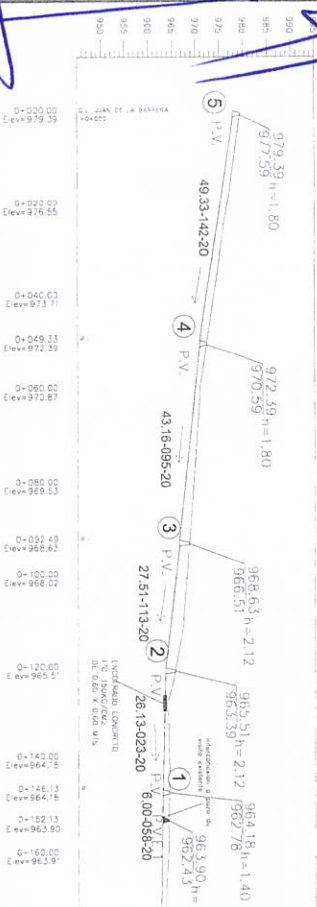


PERFIL PRIV. JUAN DE LA BARRERA

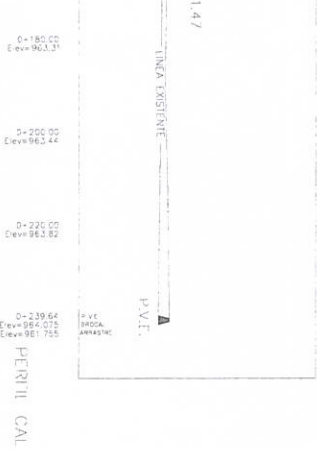


PERFIL CALLE FELIPE ANCHUTS




MACROLOCALIZACION

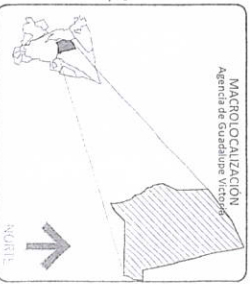

MICROLOCALIZACION

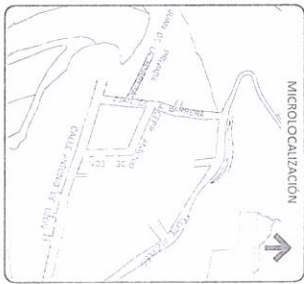




SIMBOLOGIA

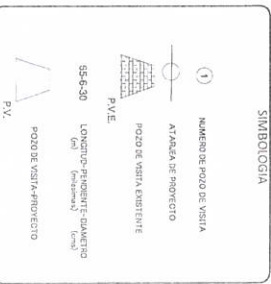

Orden de Jure




SECCION TRANSVERSAL Y DIMENSIONES DE POZO DE VISITA COMÚN

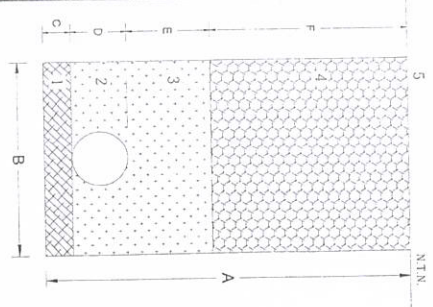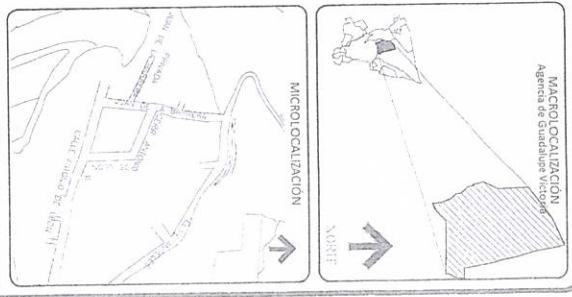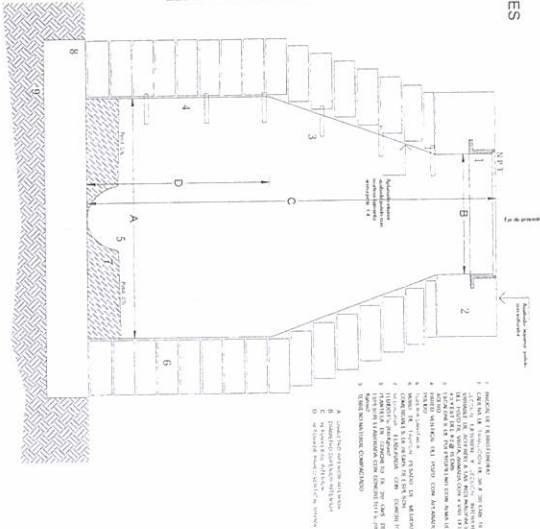
[illegible]

ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES SANITARIOS:

1. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL, CORROBORANDO LAS COTAS DE TERRENO INDICADAS EN EL PROYECTO Y EL NIVEL DE ARRASTRE QUE SERVIRÁ COMO PUNTO DE DESARROLLO FINAL.
2. LOS ANCHOS DE ZUMAS INDICADOS CORRESPONDEN AL MÍNIMO. ESTOS PODRÁN VARIAR EN FUNCIÓN AL TIPO DE TERRENO Y SUJETO AL CRITERIO DE LA SUPERVISIÓN.
3. SE DEBERÁ DE COMPACTAR DE MANERA UNIFORME EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA CAMA DE ARENA QUE SERVIRÁ DE APOYO DIRECTO A LA TUBERÍA INDICADO. DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS, SE DEBERÁN DE CORROBORAR LOS ARRASTRES PROYECTOS EN EL PROYECTO, PARTICIPAMENTE EN LOS SITIOS DONDE SE HAYAN PROYECTADO POZOS DE VISIÓN O REGISTROS SANITARIOS.
4. LA TUBERÍA SE APOYARÁ DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR. LA MISMA SERÁ COLOCADA DE ADELANTE ADELANTE A ADELANTE ADELANTE.
5. SE UTILIZARÁ RELLENO DE MATERIA, MEJORADO DE BANCO PARA EL ACOSTILLADO Y SOBRE EL LOMO DE TUBO EN POR LO MENOS 30 CM. ESTE SERÁ COLOCADO CON PISÓN DE 20 LBS. Y EN CASAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, COLOCADO PREVIAMENTE CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA DIFUSIÓN DE AGUA Y EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERÍA PARA EVITAR DEFORMACIONES DE LA MISMA.
6. SE DEBERÁ DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA, INSTALADA SOMETIENDO A UNA PRESIÓN HIPEROSTÁTICA DE OXIGENO (O₂ O N₂) (NOM-001-CONAGUA).
7. LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIA DE RELLENO, VA SER PARA LA PROTECCIÓN Y ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA O PARA EL RELLENO SUPERIOR, DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDO EN TODO MOMENTO LOS RANOS DE COMPACTACIÓN ESTIPULADOS.
8. LA TUBERÍA A USAR EN LOS PROYECTOS DE DRENAJE SANITARIO, SERÁ PARA ALCAANTARILLADO SANITARIO HERMETICO, FABRICADA CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) Y SISTEMA DE UNIÓN ESPICA-CAMPAÑA, CERTIFICADO CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA Y NOM-001-CONAGUA, SE DEBERÁN DE RESPETAR LOS DIÁMETROS INDICADOS EN CADA PROYECTO.
9. EL TIPO DE CEMENTO A UTILIZAR PARA LA ELABORACIÓN DE POZOS DE VISIÓN, REGISTROS Y TAPAS DE LOS MISMOS, PLANTILLAS, CONSERVADEROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS, PLANTILLAS, MEDIOS CAJAS Y ELEMENTOS VARIOS, SERÁ TIPO CR-30-30-85, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-44-CONCRETO-VENTE, RESISTIENDO LAS DIFUSIONES ADECUADAS PARA OBTENER LAS RESISTENCIAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO. EN CASO DE QUE LOS PROYECTOS Y LAS PROPORCIONES VOLUMÉTRICAS SEÑALADAS EN LOS MORTEROS, LAS PROPORCIONES INTERIORES SERÁN CON ACABADO PLÚMBO Y PLANADOS EXTERIORES SERÁN CON ACABADO RUSTICO PROPORCIÓN 1:1 CEMENTO:ARENA, CUANDO SE ENCUENTREN EXPUESTOS ARRIBA DE LA PASANTE.
10. TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERÁ DE SER AVALUADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FIN, Y DEBERÁ DE SER ASIGNADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE.

PLANTA
IAPA DE HIERRO FUNDIDO

PLANTA DE FONDO DE POZO DE VISITA COMÚN

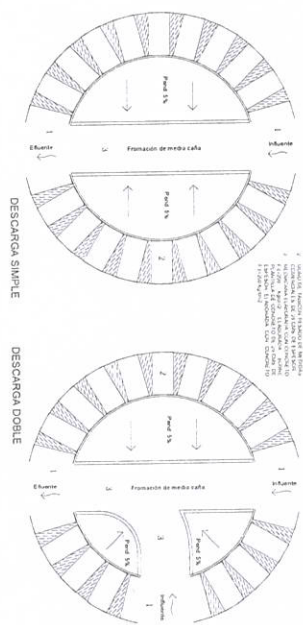[illegible]




"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REPORTE DE AVANCE

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 28 de septiembre de 2023.

NOMBRE DE LA OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAGE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA".	
NUMERO DE OBRA:		FIII-004-2023	
FONDO:		FIII FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
FINALIDAD:		2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCION:		2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	
SUBFUNCION:		2.2.1.- URBANIZACIÓN.	
MODALIDAD DE EJECUCION:		CONTRATO.	
CONTRATO No.:		DCSYCOP/FIII 004/2023	
CONTRATISTA:		GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	
AVANCE FISICO:		5 %	

• TRABAJOS EN PROCESO.



ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

EXPEDIENTE TÉCNICO

FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2023

EJERCICIO: 2023

ESTADO: 020 OAXACA

REGION: 08 VALLES CENTRALES

DISTRITO: 19 CENTRO

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ

LOCALIDAD: 1201 AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAGE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)

CONDOS: TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)

ACTIVIDADES GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

[illegible]

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

RESUMEN TOTAL Y GENERAL

EJERCICIO:	2023
ESTADO:	020 OAXACA
REGION:	08 VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19 CENTRO
MUNICIPIO:	067 OAXACA DE JUAREZ
LOCALIDAD:	1201 AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RAMO:	RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)
FONDO:	FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)

RESUMEN POR FUNCION Y SUBFUNCION:

OBJETO	AGUA POTABLE
61412 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	PRELIMINARES EXCAVACIONES TUBERIA Y FONTANERIA ATRAQUES E INTERCONEXIONES RELLENOS Y COMPACTADOS LIMPIEZA Y ACARREOS
SUBTOTAL	\$39,515.29
L.V.A. 16%	\$108,458.75
TOTAL	\$120,473.94
	\$260,382.55
	\$91,349.94
	\$35,626.82
	\$655,807.29
	\$104,929.17
	\$760,736.46
IMPORTE CON LETRA: (SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 46/100 M N.)	
PARTIDA PRESUPUESTAL	INVERSION TOTAL
PARTIDAS	

AUTORIZO	ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
MTRA. YVONNE DENISSE ARANDA VALENZUELA	
Vo.Bo.	



REPORTE DE AVANCE


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 28 de septiembre del 2023

Nombre de la Obra:	"REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXCA DE JUAREZ, OAXCA."	
Contratista:	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A DE C.V.	
Numero de la Obra:	FIII/006/2022	
Numero de contrato:	DCSYCOP/FIII 006/2023	
Fecha de contrato:	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
Monto del contrato:	\$ 548,385.27Incluye el I.V.A.	12.52 %
Avance Físico General.		

- ☐ SE REALIZARON TRABAJOS DE DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO NEUMÁTICO Y COMPRESOR.
- ☐ DEMOLICIÓN A MÁQUINA, DE GUARNICIÓN TIPO CORDÓN CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, DE 17 CMS. DE PERALTE.
- ☐ LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES.



DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE BANQUETA

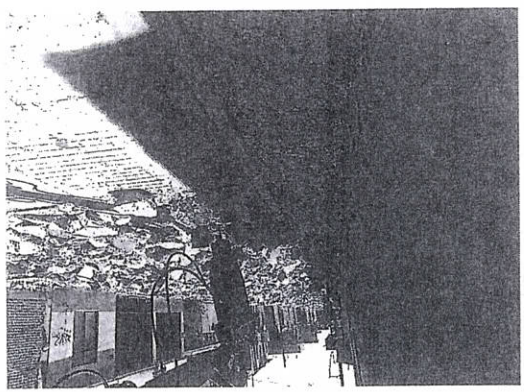

DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE GUARNICIÓN

ARG. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRAS
Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

17-01

EXPEDIENTE TÉCNICO

FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2023

EJERCICIO: 2023

ESTADO: 020 OAXACA

REGION: 08 VALLES CENTRALES

DISTRITO: 19 CENTRO

MUNICIPIO: 057 OAXACA DE JUAREZ

LOCALIDAD: 0101 AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RAMO: RAMO 39 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)

FONDO: FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)

CARACTERISTICAS GENERALES:

SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO DE 5 CMS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION A MAQUINA, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, DEMOLICION A MAQUINA, DE GUARNICION TIPO CORDON CUÑETA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DE 17 CMS DE PERALTE, DEMOLICION A MANO DE ESCALONES DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO DE SECCION TRANSVERSAL 30 X 18 CMS, RETIRO TEMPORAL DE LETRERO ALUSIVO EXISTENTE ELABORADO CON PERFILES PIR Y LAMINA METALICA, RETIRO TEMPORAL, RESGUARDO Y POSTERIOR COLOCACION DE TORRE DE BANQUETA EXISTENTE, LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE BALUARINA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BALUARINA DE COMPACTACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO F-C-200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE ESCALON DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DE SECCION TRANSVERSAL 30 X 18 CMS, CIMENTA AFAPARENTE PARA LA FORMACION DE ARRIATE CIRCULAR CON DIAMETRO DE 40 CMS Y ALTURA DE 15 CMS, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE, INCLUYE DESMONTAJE CON RECUPERACION DE CONTRAMARCO Y MARCO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 7 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y DE 40 X 60 CMS DE SECCION, RESGUARDO DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE DUFLEX, INCLUYE DESMONTAJE CON RECUPERACION DE CONTRAMARCO Y MARCO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 7 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y DE 60 X 60 CMS DE SECCION, RESGUARDO DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE, INCLUYE DESMONTAJE CON RECUPERACION DE LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y DE 60 X 60 CMS DE SECCION, RESGUARDO DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE, INCLUYE DESMONTAJE CON RECUPERACION DE LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y DE 60 X 60 CMS DE SECCION, RESGUARDO DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO BASE SOLVENTE, ACABADO MATE RESISTENTE A LA ABRASION E INTemperIE, APLICADA A DOS MANOS EN CARAS VISIBLES DE GUARNICIONES TIPO MACHUETLO DE 70 LTS, CON BROCHA, RODILLO O ASPERSOR, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA

Vo.Bo.

MTSA YVONNE DENISSE ARANDIA VALENZUELA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C. EUSTORGIO OLIVERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTRACCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PUBLICA

AUTORIZO

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2023

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

I.- UBICACIÓN		CLAVE	NOMBRE
Estado:	020	OAXACA	
Región:	08	VALLES CENTRALES	
Distrito:	19	CENTRO	
Municipio:	067	OAXACA DE JUAREZ	
Localidad:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI	
Tipo de Localidad:		CP ()	PR ()

II.- IDENTIFICACIÓN		CLAVE	NOMBRE
FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1	URBANIZACION	
Nombre de la Obra:		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	

Situación de la obra:		Inicio ()	Inicio-Término (X)	Continuación ()	Término ()
Modalidad de la ejecución:		C (X)	AD ()		

III.- M E T A S

Unidad de Medida:	M2	Totales del Proyecto	230.30	Totales del Ejercicio	230.30
% Avance Físico Acumulado al 31/12/2022	0.00%	% Avance Físico Programado al 31/12/2023	100%	Fecha Programada de Inicio:	AGOSTO DEL 2023
% Avance Físico Programado al 31/12/2023	100%	Fecha Programada de Término	OCTUBRE DEL 2023	Nº de Jornales a generar:	243.01
Nº de Beneficiarios:	420	Tipo de Beneficiarios	PERSONAS	Nº de Beneficiarios Mujeres:	219
Nº de Beneficiarios Hombres:	201				




REPORTE DE AVANCE

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 28 de septiembre del 2023

Nombre de la Obra:	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXCA DE JUAREZ, OAXCA."		
Contratista:	GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A DE C.V.		
Número de la Obra:	FIII/007/2023		
Numero de contrato:	DCSYCOP/FIII 007/2023		
Fecha de contrato:	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
Monto del contrato:	\$ 1,457,255.66 Incluye el I.V.A.		
Avance Fisico General:	9.30 %		

- ☐ SE EJECUTARON TRABAJOS DE DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO.
- ☐ TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL.

DEMOLICIONES DE PAVIMENTO

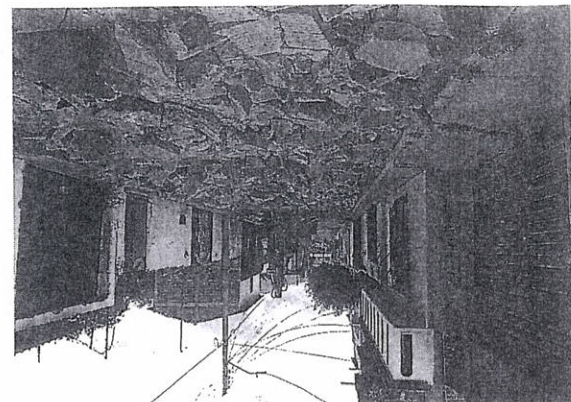

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO



ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA

Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

15-01

EXPEDIENTE TECNICO

FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2023

EJERCICIO: 2020 OAXACA
REGION: 08 VALLES CENTRALES
DISTRITO: 19 CENTRO
MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ
LOCALIDAD: 0101 AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LA ERA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RAMO: RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)

FONDO: FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)

CARACTERISTICAS GENERALES:

SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICION A MAQUINA, DE TOPE EXISTENTE ELABORADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE REGILLA PLUVIAL EXISTENTE, DE MEDIDAS INTERIORES 0.65 X 0.46 MTS. RETIRO DE REGILLA PLUVIAL EXISTENTE, DE MEDIDAS INTERIORES 0.75 X 0.58 MTS. LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION EXISTENTE, DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUCCION DE REGILLA PARA AGUAS PLUVIALES DE SECCION RECTANGULAR DE 3.00 X 0.50 MTS. (LARGO-ANCHO) Y DE 0.50 MT. DE PROFUNDIDAD MAXIMA, INTERCONEXION DE REGILLA PARA AGUAS PLUVIALES NUEVA CON EXISTENTE, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CORTE EN CALA EN TERRENO NATURAL TIPO II, CON MOTONIVELADORA, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCOMPACTADORA Y VIBROCOMPACTADORA, AFINE Y COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA CON MOTONIVELADORA, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. NIVELACION DE POZO DE VISTA DE 0.00 A 0.25 MTS. ABAYO DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, REDUCCION DE VELOCIDAD ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO, AGARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, PARA ENTREGA DE LA MISMA

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PUBLICA

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENZUELA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

Vo.Bo.

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2023

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

I.- UBICACIÓN		CLAVE	NOMBRE
Estado:	020	OAXACA	
Región:	08	VALLES CENTRALES	
Distrito:	19	CENTRO	
Municipio:	057	OAXACA DE JUAREZ	
Localidad:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI	
Tipo de Localidad:		CP ()	PR ()

II.- IDENTIFICACIÓN

FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	2.2.1	URBANIZACION
Nombre de la Obra:		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.		

Situación de la obra:	Inicio ()	Inicio-Término (X)	Continuación ()	Término ()
Modalidad de la ejecución:				
C (X) AD ()				

III.- METAS

Unidad de Medida:	M2	Totales del Proyecto	877 22
		Totales del Ejercicio	877 22
% Avance Físico Acumulado al 31/12/2022			
0.00%			
% Avance Físico Programado al 31/12/2023			
100%			
Fecha Programada de Inicio:	AGOSTO DEL 2023	Fecha Programada de Término	NOVIEMBRE DEL 2023
Nº de Jornales a generar:	387.27		
Nº de Beneficiarios:	420	Tipo de Beneficiarios	PERSONAS
Nº de Beneficiarios Mujeres:	219		
Nº de Beneficiarios Hombres:	201		



Oaxaca de Juárez

2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REPORTE DE AVANCE


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 28 de septiembre de 2023.

NOMBRE DE LA OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA".	
NUMERO DE OBRA:		FIII-009-2023	
FONDO:		FIII FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
FINALIDAD:		2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCION:		2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	
SUBFUNCION:		2.2.1.- URBANIZACIÓN.	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:		CONTRATO.	
CONTRATO No.:		DCSYCOP/FIII 009/2023	
CONTRATISTA:		DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS, GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V.	
AVANCE FISICO:		16 %	

• TRABAJOS EN PROCESO.



Trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia.

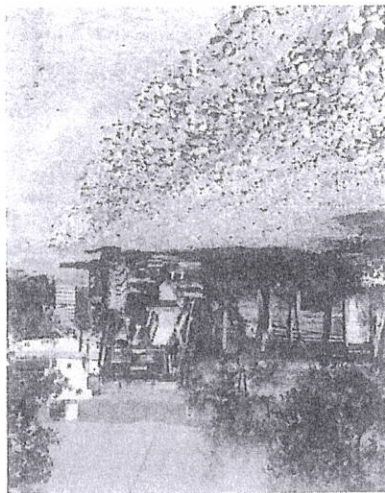

Conformación de base hidráulica (revestimiento-grava-arena).

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANEJO DE AGUAS

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

E1-01

EXPEDIENTE TÉCNICO

EJERCICIO:	2023
ESTADO:	020 OAXACA
REGIÓN:	08 VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19 CENTRO
MUNICIPIO:	067 OAXACA DE JUAREZ
LOCALIDAD:	0701 AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RAMO:	RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)
FONDO:	FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PAVIMENTO: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; RETIRO DE TOCÓN DE ÁRBOL; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO III, CON RETROEXCAVADORA; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, CON RETROEXCAVADORA; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON MOTONIVELADORA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA; RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO BASE SOLVENTE; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE. GUARNICIONES: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO, ELABORADA CON CONCRETO HIDRÁULICO; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BALARINA DE COMPACTACIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA TRITURADA DE PIEDRA CALIZA COLOCADA HORIZONTALMENTE; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA.

ING. EUSTORGIO OCAÑO SALINAS	DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AUTORIZO	Vo.Bo

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

FECHA: 07 DE JULIO DEL 2023

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

I. UBICACIÓN		CLAVE	NOMBRE
Estado:	020	OAXACA	
Región:	08	VALLES CENTRALES	
Distrito:	19	CENTRO	
Municipio:	067	OAXACA DE JUAREZ	
Localidad:	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	
Tipo de Localidad:		CP ()	PR ()

II. IDENTIFICACIÓN

FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	2.2.1	URBANIZACION
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	

Situación de la obra: Inicio () Continuation () Término ()

Modalidad de la ejecución: C (X) AD ()

III. METAS

Unidad de Medida	M2	Totales del Proyecto	749.47
% Avance Físico Acumulado al 31/12/2022	0.00%	Totales del Ejercicio	749.47
% Avance Físico Programado al 31/12/2023	100%		
Fecha Programada de Inicio:	AGOSTO DEL 2023	Fecha Programada de Término	NOVIEMBRE DEL 2023
N° de Jornales a generar	423.73		
N° de Beneficiarios:	200	Tipo de Beneficiarios	PERSONAS
N° de Beneficiarios Mujeres:	104		
N° de Beneficiarios Hombres:	96		



Oaxaca de Juárez

2022 - 2024


"2023, Año de la Interculturalidad"

Reporte de Avance


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 28 de septiembre de 2023.

NOMBRE DE LA OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES BENITO JUAREZ Y REFORMA, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA"	
NUMERO DE OBRA:		FIII-010-2023	
FONDO:		FIII FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
FINALIDAD:		2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCION:		2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	
SUBFUNCION:		2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:		CONTRATO.	
CONTRATO No.:		DCSYCOP/FIII 010/2023	
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
AVANCE FISICO:		25 %	

• TRABAJOS EN PROCESO.

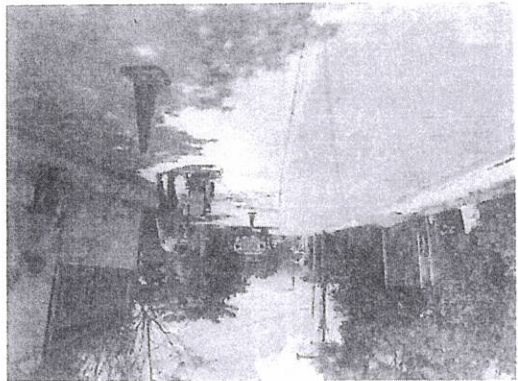

Trabajos de corte de concreto hidráulico con cortadora de piso.

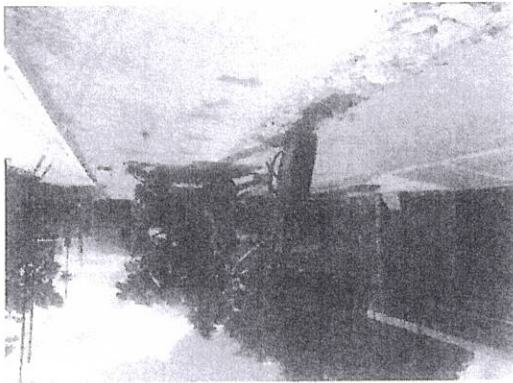

Trabajos de demolición de concreto hidráulico con maquinaria pesada (retroexcavadora con martillo).

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

ET-01

EXPEDIENTE TECNICO

FECHA: 07 DE JULIO DEL 2023	ESTADO: 020 OAXACA	REGION: 08 VALLES CENTRALES	DISTRITO: 19 CENTRO	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ	LOCALIDAD: 1001 AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES BENITO JUAREZ Y REFORMA AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.					
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO					
RAMO: RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)					
FONDO: FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)					

CARACTERISTICAS GENERALES:

SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL; DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; PROFUNDIDAD DEL CORTE; DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO SERIE INGLES, CON UNION DE CAMPANA TIPO ANGEL, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, DE 76 MM. NOMINAL (12") DE DIAMETRO; QUE SOPORTE UNA PRESION DE 11.1 KG/CM2; SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 450 X (50 MM) 2" DE DIAMETRO; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 2" X 2" (50 MM X 50 MM) DE DIAMETRO; SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 900 X (50 MM) 2" DE DIAMETRO; SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE FO. FO. DE (51 MM) 2" DE DIAMETRO; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE $F_c = 150$ KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM) 3/4", PARA TUBERIA DE (51 MM A 151 MM) 2" - 6", CON DIMENSIONES DE 30 X 30 X 50 CM.; CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "A", MODULO DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BALARINA DE COMPACTACION; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON BALARINA DE COMPACTACION Y MEDIOS MANUALES; CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTE Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA.

AUTORIZO

ING. EUSTORGIO CAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTROL DE OBRA PUBLICA

MTA. YVONNE DENISSE ARANDA VALENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Vo:Bo

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

FECHA: 07 DE JULIO DEL 2023

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

I.- UBICACIÓN		CLAVE	NOMBRE
Estado:	020	OAXACA	
Región:	08	VALLES CENTRALES	
Distrito:	19	CENTRO	
Municipio:	067	OAXACA DE JUAREZ	
Localidad:	1001	AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN	
Tipo de Localidad:		CP ()	PR ()

II.- IDENTIFICACIÓN		CLAVE	NOMBRE
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	

Nombre de la Obra:		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE , CALLES BENITO JUAREZ Y REFORMA,AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.			
Situación de la obra:		Inicio ()	Inicio-Término (X)	Continuación ()	Término ()
Modalidad de la ejecución:		C (X)		AD ()	

III.- METAS

Unidad de Medida:		ML		Totales del Proyecto	216.72
				Totales del Ejercicio	216.72
% Avance Fisico Acumulado al 31/12/2022		0.00%			
% Avance Fisico Programado al 31/12/2023		100%			
Fecha Programada de Inicio:		AGOSTO DEL 2023		Fecha Programada de Término	NOVIEMBRE DEL 2023
N° de Jornales a generar:		182.66			
N° de Beneficiarios:		152		Tipo de Beneficiarios	PERSONAS
N° de Beneficiarios Mujeres:		80			
N° de Beneficiarios Hombres:		72			



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 31 de julio de 2023

MTA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
P R E S E N T E


Nombre de la obra	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
y/o tema:	2023.
Periodo de contrato:	27 de abril 2023 – 13 de agosto 2023
Periodo de ejecución:	01 de julio 2023 – 31 de julio 2023
Monto del contrato:	\$ 5,790,720.00 IVA INCLUIDO
Avance Físico	39.49 %

Hasta la fecha el avance en Bacheo de calles con carpeta asfáltica zona volante del Municipio de Oaxaca de Juárez es el siguiente:

- JULIO 2023. En este mes se intervinieron las calles de:
- Dándonos un total en este mes de 6,769.45 m2

CALLES	M2
PUNTE TECNOLÓGICO	87.38
BOULEVARD EDUARDO MATA	120.27
NIZAA	62.15
MARTIRES DE RÍO BLANCO	222.31
AVENIDA MONTAÑA	64.44
NIZAA	71.45
TECNOLÓGICO	108.13
NIZAA	161.24
AZUCENAS	65.55
AVENIDA MONTAÑA	72.85
GUILLU	77.76
GUADALUPE VICTORIA	58.08
AVENIDA MONTAÑA	90.38
5 DE MAYO	9.06
JOSÉ MARIA MORELOS	2.44
INDEPENDENCIA	5.05
PORFIRIO DÍAZ	12.28
MARTIRES DE RÍO BLANCO	43.44
AVENIDA PRINCIPAL ALAMOS	64.84
INDEPENDENCIA	27.80
NICOLAS DEL PUERTO	6.92
MARIANO ABASOLO	5.23
RÍO VERDE	50.41
PENSAMIENTOS	69.94
RÍO VERDE	39.37

CALLES	M2
PENSAMIENTOS	69.94
RÍO VERDE	39.37
MARTIRES DE RÍO BLANCO	72.15
NIZAA	73.79
VICENTE GUERRERO	18.46
LEANDRO VALLE	14.99
CALZ. DE LA REPUBLICA Y AV.	25.93
NIZAA	34.08
AVENIDA MONTAÑA	25.26
RÍO VERDE	60.41
SANTOS DEGOLLADO	13.42
BOULEVARD EDUARDO MATA	21.96
VALERIO TRUJANO	2.44
VALERIO TRUJANO	15.23
AVENIDA JUÁREZ MATA	84.73
NEZAHUALCOYOTL	81.83
PRIVADA DE RÍO BLANCO	61.19
PERIFÉRICO	18.52
PUNTE VALERIO TRUJANO	13.79
CALLE VICTORIA	2.28
AVENIDA ALAMOS	40.81
DIVISIÓN ORIENTE	11.40



ING. CARLOS ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

TARJETA INFORMATIVA



Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 13 de agosto de 2023

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
P R E S E N T E

Nombre de la obra	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
Y/o tema:	2023.
Periodo de contrato:	27 de abril 2023 – 13 de agosto 2023
Periodo de ejecución:	01 de julio 2023 – 13 de agosto 2023
Monto del contrato:	\$ 5,790,720.00 IVA INCLUIDO

- Agosto 2023. Se intervinieron las calles de:
- Dándonos un total en este mes de 978.78 m2

CALLE	BACHEO SUPERFICIAL M2
RÍO GRUJALVA	39.52
RÍO GRUJALVA	41.48
RÍO AMAZONAS	0.72
BARRIDOS	17.69
4TA PRIV. DE LA NORIA	44.27
MANUEL SABINO CRESPO	32.37
RÍO GRUJALVA	101.94
PERIFÉRICO	49.87
ALDAMA	9.04
BLVD. EDUARDO VASCONCELOS	12.1
4TA PRIVADA DE LA NORIA	31.58
RÍO GRUJALVA	61.50
4TA PRIV. DE LA NORIA	55.15
PERIFÉRICO	28.04
AVENIDA MIGUEL HIDALGO	52.57
MANUEL SABINO CRESPO	14.74
TINOCO Y PALACIOS	29.64
4TA PRIVADA DE LA NORIA	39.83
BOULEVARD EDUARDO MATA	39.28
RÍO GRUJALVA	44.12
BOULEVARD EDUARDO	52.03
VASCONCELOS	27.66
RÍO GRUJALVA	27.18
DÍAZ QUINTAS	89.37
GALEANA	37.10
RÍO GRUJALVA	

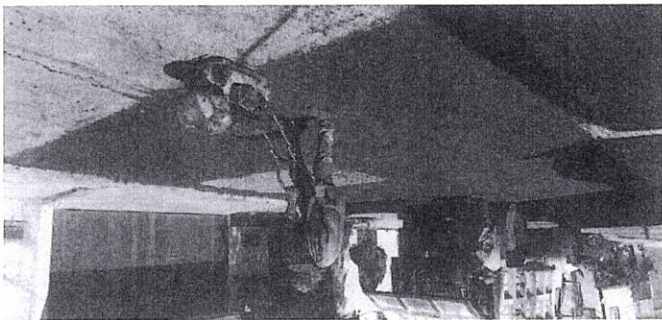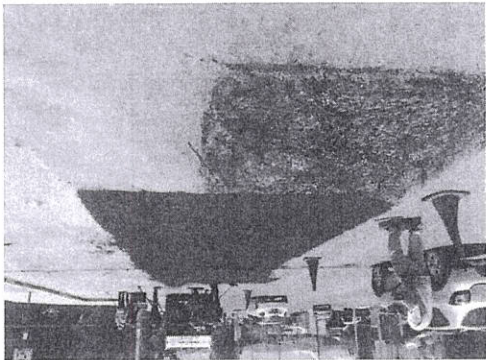

ING. CARLOS ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 29 de septiembre de 2023

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
P R E S E N T E

Nombre de la obra	y/o tema:	Periodo de ejecución:
BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	2023.	01 de septiembre 2023 – 30 de septiembre 2023

• Septiembre 2023.

• Total de metros cuadrados de bacheo en este mes: 4,684.32 m2

CALLES	M2
TERRA PRIVADA DE INDEPENDENCIA	51.88
XOCHITL Y GONZALEZ ORTEGA	17.84
CUMBRES DE ACULTZINGO	33.91
C.MONTE ALBAN	56.37
2DA PRIVADA DE ALCALA	36.11
TERRA PRIVADA DE INDEPENDENCIA	89.63
YAGUL Y CALLE MONTE ALBAN	43.21
CUMBRES DE ACULTZINGO	52.94
MARIO PÉREZ RAMÍREZ	48.6
MIGUEL HIDALGO	34
CARRETERA ANTIGUA A XOXCOTLÁN	60.37
9 DE SEPTIEMBRE	27.34
GONZALEZ ORTEGA	5.76
LA COSTA	77.95
ARMENIA Y LÓPEZ	3.99
LATERAL DE PERIFÉRICO SUR	11.52
CALLE MORELOS	4.78
CALZADA DE LA REPÚBLICA	11.4
REFORMA	42.18
9 DE SEPTIEMBRE	46.14
YAGUL	66.54
MIGUEL HIDALGO	32.66
CARRETERA ANTIGUA A XOXCOTLÁN	55.74
MORELOS	6.05
CARRETERA ANTIGUA A XOXCOTLÁN	79.24

CALLES	M2
GARCÍA VIGIL Y M. HIDALGO	63.70
9 DE SEPTIEMBRE	75.91
MOCTEZUMA	100.17
BLVD. EDUARDO MATA	57.07
YAGUL	91.42
GARCÍA VIGIL	43.37
AVENIDA LA PAZ	59.14
ALVARO OBREGÓN	59.15
AGUSTÍN MELGAR	26.84
CARRETERA ANTIGUA A XOXCOTLÁN	16.05
YAGUL	51.54
IGNACIO BERNAL	81.47
MACEDONIO ALCALA	110.65
CARRETERA A DONAJÍ	32.02
CALLE DOS	104.64
YAGUL Y ZACHILA	107.16
MACEDONIO ALCALA	112.36
ALVARO OBREGÓN	70.56
ALVARO OBREGÓN	51.51
CALZADA FRANCISCO I. MADERO	9.16

ING. CARLOS ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANEJO URBANO

24.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

Plazuela Vicente Guerrero número 5, colonia Ex Marquesado, C.P. 68030, Oaxaca de Juárez, Oax.
(951) 5151352-5152231

www.municipiodcoaxaca.gob.mx



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"


REPORTE DE AVANCE

30/agosto/2023


NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 118 MATRÍCULA 20DST0127B, CABECERA MUNICIPAL, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS, CALLE RÍO TEHUANTEPEC, No. 300 (SEGUNDA ETAPA)"
NUMERO DE LA OBRA: RF/004/2023
FONDO: RECURSOS FISCALES
FINALIDAD: 2.- DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 2.5.- EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
CONTRATO No.: DCSYCOP/AD/RF 004/2023
CONTRATISTA: CARISER CO S.A. DE C.V.
AVANCE FISICO : 100 %
FECHA: 31 DE MARZO DE 2021.

TRABAJOS EJECUTADOS:

- Conclusión de los trabajos

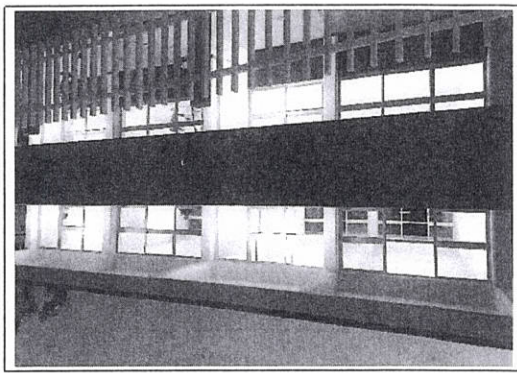

Panorámica Interior

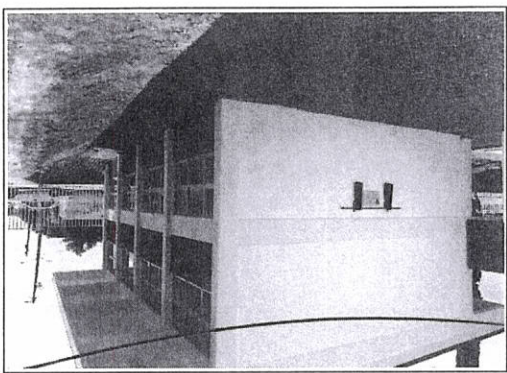

Panorámica Exterior

ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANEJO URBANO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

12.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.


Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

Plazuela Vicente Guerrero números, colonia Ex Marquésado, C.P. 68030, Oaxaca de Juárez, Oax.
(951) 5151352-5152231


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA
RESIDENTE DE OBRA

Puertas interior

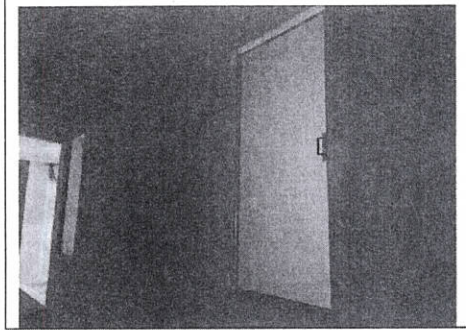

Fachada sur poniente

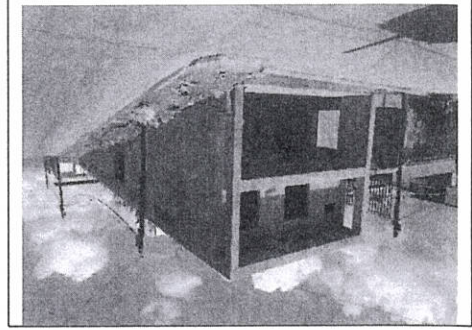

• Conclusión de trabajos de la segunda etapa

TRABAJOS EJECUTADOS:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA "DOLORES" EN LA
AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA"
NUMERO DE LA OBRA: RF/002/2023
FONDO: RECURSOS FISCALES
FINALIDAD: 2.- DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 2.2.1.- URBANIZACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
CONTRATO No.: DCSYOP/AD/RF 002/2023
CONTRATISTA: FECHA: 31 DE MARZO DE 2021.
PERÍODO DE EJECUCIÓN: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.
PERÍODO DIFERIDO: 03 DE ABRIL DE 2023 AL 01 DE JUNIO DE 2023
AVANCE FISICO : 16 DE JUNIO DE 2023 AL 14 DE AGOSTO DE 2023
100 %

REPORTE DE AVANCE

31/AGOSTO/202

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024



Oaxaca
de Juárez
CIUDAD
EDUCADORA



Ciudades Mexicanas
PATRIMONIO MUNDIAL

