



INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

UNIDAD RESPONSABLE	303. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22. Seguimiento y Control de Obra Pública	
COMPONENTE	1. Planeación de la obra pública municipal	VALOR
La planeación de la obra pública municipal es un proceso estratégico que busca garantizar la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la población. Este componente incluye las actividades de procesos de licitación, contratos celebrados e integración de expedientes técnicos		0%
ACTIVIDAD	1.1 Procesos de licitación celebrados de acuerdo a las leyes aplicables	0%
INDICADOR	Porcentaje de procesos de licitación celebrados con eficiencia, eficacia y honradez	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y EVIDENCIAS:

Durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano trabajó en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en el proceso de integración del Acta de Priorización de Obras y Programa Anual de Obras, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Este trabajo conjunto tuvo como objetivo garantizar una adecuada planeación y priorización de las obras que serán ejecutadas.

Como resultado de este proceso, no se llevaron a cabo procedimientos de licitación durante el primer trimestre, ya que la normativa establece que la realización de licitaciones debe estar precedida por la aprobación formal del Acta de Priorización de Obras y del Plan de Obras Municipal. Estos documentos son indispensables para definir de manera clara y precisa las obras a ejecutar, así como para asegurar que los procedimientos de contratación se realicen de manera transparente y conforme a la ley.

La ausencia de licitaciones en este periodo no implica inactividad administrativa, sino el cumplimiento de las etapas legales y técnicas necesarias para garantizar una correcta planeación. Una vez que el CDSM determine y apruebe las obras prioritarias, y los proyectos ejecutivos estén debidamente validados, se dará inicio a los procesos de licitación bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

Elaboró

Arq. Silvano Reyna Eguía
Jefa de Departamento de
Licitaciones y Contratos

Autorizo

Ing. Ulises Alejandro Morán Marín
Director de Contratación,
Seguimiento y Control de Obra
Pública

Vo. Bo.

Ing. Carlos Facundo Alcocer Pérez
Secretario de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027



INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

UNIDAD RESPONSABLE	303. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22. Seguimiento y Control de Obra Pública	
		VALOR
COMPONENTE	1. Planeación de la obra pública municipal	0%
ACTIVIDAD	1.2 Contratos celebrados de acuerdo a las leyes aplicables	0%
INDICADOR	Porcentaje de contratos celebrados con eficiencia, eficacia y honradez	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y EVIDENCIAS:


Durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano trabajó en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en el proceso de integración del Acta de Priorización de Obras y del Plan de Obras Municipal, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Este trabajo conjunto tuvo como objetivo garantizar una adecuada planeación y priorización de las obras que serán ejecutadas.

Como resultado de este proceso, no se llevaron a cabo procedimientos de licitación ni formalización de contratos durante el primer trimestre, ya que la normativa establece que tanto las licitaciones como la firma de contratos deben estar precedidas por la aprobación formal del Acta de Priorización de Obras y del Plan de Obras Municipal. Estos documentos son indispensables para definir de manera clara y precisa las obras a ejecutar, así como para asegurar que los procedimientos de contratación se realicen de manera transparente y conforme a la ley.

La ausencia de licitaciones y contratos en este periodo no implica inactividad administrativa, sino el cumplimiento de las etapas legales y técnicas necesarias para garantizar una correcta planeación. Una vez que el CDSM determine y apruebe las obras prioritarias, y los proyectos ejecutivos estén debidamente validados, se dará inicio a los procesos de licitación y formalización de contratos bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

Elaboró


Arq. Silvano Reyna Egúía
Jefa de Departamento de
Licitaciones y Contratos



Ing. Ulises Alejandro Morán Marín
Director de Contratación,
Seguimiento y Control de Obra
Pública

Vo. Bo.

Ing. Carlos Facundo Alcocer Pérez
Secretario de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano



Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027



INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025



UNIDAD RESPONSABLE	303. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22. Seguimiento y Control de Obra Pública	
COMPONENTE	1. Planeación de la obra pública municipal	0%
ACTIVIDAD	1.3 Integración de expedientes técnicos unitarios	0%
INDICADOR	Porcentaje de acciones para la integración de expedientes técnicos unitarios realizadas	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y EVIDENCIAS:

Durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano trabajó en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en el proceso de integración del Acta de Priorización de Obras y del Plan de Obras Municipal, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Este trabajo conjunto tuvo como objetivo garantizar una adecuada planeación y priorización de las obras que serán ejecutadas.

Como resultado de este proceso, no se llevaron a cabo procedimientos de licitación ni formalización de contratos durante el primer trimestre, ya que la normativa establece que tanto las licitaciones como la firma de contratos deben estar precedidas por la aprobación formal del Acta de Priorización de Obras y del Plan de Obras Municipal. Estos documentos son indispensables para definir de manera clara y precisa las obras a ejecutar, así como para asegurar que los procedimientos de contratación se realicen de manera transparente y conforme a la ley.

La ausencia de licitaciones y contratos en este periodo no implica inactividad administrativa, sino el cumplimiento de las etapas legales y técnicas necesarias para garantizar una correcta planeación. Una vez que el CDSM determine y apruebe las obras prioritarias, y los proyectos ejecutivos estén debidamente validados, se dará inicio a los procesos de licitación y formalización de contratos bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

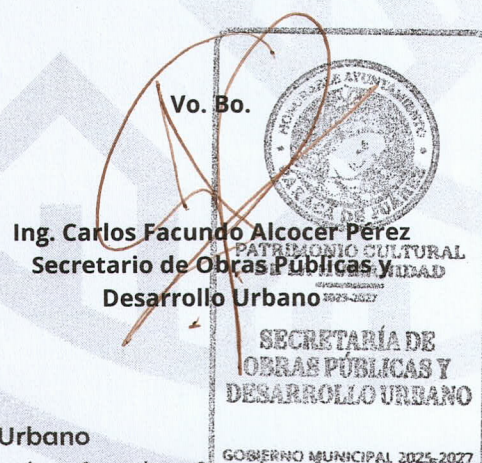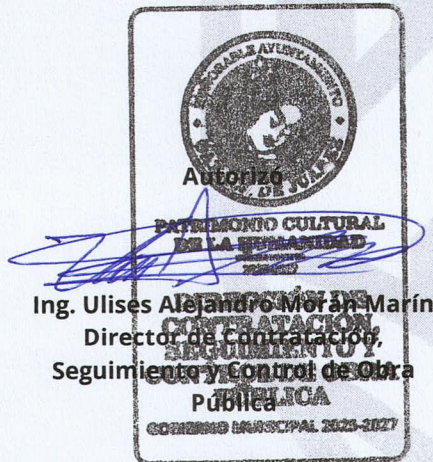

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano





INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

UNIDAD RESPONSABLE	303. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22. Seguimiento y Control de Obra Pública	
COMPONENTE	2. Supervisión y conclusión de la obra pública municipal.	2%
ACTIVIDAD	2.1 Supervisión de la obra pública municipal	5%
INDICADOR	Porcentaje de obras públicas que fueron supervisadas durante su ejecución	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y EVIDENCIAS:

Las obras públicas supervisadas durante su ejecución abarcan proyectos de infraestructura urbana, movilidad, saneamiento, espacios recreativos y conservación del patrimonio. La supervisión garantiza que las construcciones cumplan con los estándares de calidad, seguridad y normativas vigentes.

Es por ello que durante el primer trimestre de 2025 realizo la supervisión de 46 obras que continuaron su ejecución durante el inicio de esta administración con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, normativas vigentes y plazos establecidos.

Las obras supervisadas en el ejercicio anterior cumplieron con los objetivos establecidos, garantizando beneficios directos para la comunidad. Se realizaron recomendaciones para mejorar tiempos de entrega y optimizar recursos en proyectos futuros.

LISTADO

No.	Número de Obra	Nombre de la Obra
1	FIII/008/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle quinta oriente, colonia Cuauhtémoc, agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez,
2	FIII/009/2024	Rehabilitación de la red de agua potable, calle quinta oriente, colonia Cuauhtémoc, agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez
3	FIII/016/2024	Construcción de andador, Rehabilitación de drenaje, agua potable y muro de contención, andador 4a. privada de Belém, colonia Heladio Ramírez López, agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
4	FIII/017/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, agencia de policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
5	FIII/018/2024	ampliación de red de agua potable en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, agencia de policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
6	FIII/019/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, agencia de policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

No.	Número de Obra	Nombre de la Obra
7	FIII/023/2024	Construcción de red de drenaje sanitario de la privada sin nombre, colonia insurgentes, agencia municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
8	FIII/033/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la agencia de municipal de San Martín Mexicapam de cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
9	FIII/043/2024	Rehabilitación de barda perimetral, escuela primaria 20 de noviembre clave 20dpr0321u, agencia de policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
10	FIII/044/2024	Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle mercurio, colonia estrella, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
11	FIII/045/2024	Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas, calle rayando el sol, colonia estrella, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
12	FIII/047/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle h. ayuntamiento, colonia 9 de mayo, agencia municipal de pueblo nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
13	FIII/048/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle 15 de junio, colonia 9 de mayo, agencia municipal de pueblo nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
14	FIII/052/2024	Construcción de cisterna de 200,000 litros con captación de aguas pluviales en la agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
15	FIII/055/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle 3° priv. palmas, agencia de policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
16	FIII/056/2024	Rehabilitación de agua potable, calle 3° priv. de palmas, agencia de policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
17	FIII/057/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20djn0645k, agencia de policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
18	FIII/058/2024	Construcción de drenaje sanitario, calle sin nombre perpendicular a libramiento norte, agencia municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
19	FIII/060/2024	Rehabilitación de calle con pavimento de concreto hidráulico, calle Morelos, barrio la soledad, agencia municipal de San Martín Mexicapam de cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
20	FIII/062/2024	Rehabilitación del drenaje calle de colón desde Iturbide hasta calle hierbabuena, agencia municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
21	FIII/064/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle san juan de la granja, colonia casa blanca, agencia municipal de San Martín Mexicapam de cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
22	FIII/065/2024	Construcción y conexión de la red de drenaje sanitario en calle galeana, tramo de calle niño artillero a carretera a Monte Albán, agencia municipal de san juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
23	FIII/066/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la agencia de municipal de san juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano





INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

No.	Número de Obra	Nombre de la Obra
24	FIII/067/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Venustiano Carranza, colonia presidentes de México, agencia municipal de pueblo nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
25	FIII/070/2024	Construcción de muro de contención en calle sabino esquina constitución, sector uno, segunda sección, agencia de policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
26	FIII/071/2024	Construcción de cisterna de 120,000 litros para captación de aguas pluviales en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con cc.t. 20dpr035j, agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
27	FIII/073/2024	Construcción de un módulo sanitario de baños en el jardín de niños "maría del Carmen Millán" con c.c.t 20djn0112y, agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
28	FIII/076/2024	Rehabilitación de cancha deportiva y Construcción de gradas en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con c.c.t. 20dpr0315j, agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
29	FIII/081/2024	Construcción de muro de contención en la calle encinos, colonia reforestación, agencia municipal de pueblo nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
30	FIII/083/2024	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico, tercera privada de Narciso Mendoza, agencia de policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
31	FIII/088/2024	Construcción de espacio multideportivo, calle periférico s/n, agencia municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
32	FIII/089/2024	Rehabilitación del campo de fútbol a unidad deportiva 1º de mayo, agencia municipal de san Felipe del agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
33	FIII/092/2024	Construcción de techado de las canchas en escuela secundaria técnica no. 6, clave 20dst0086s, boulevard Eduardo Vasconcelos no, 300, barrio de jalatlaco, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
34	FIII/093/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Álvaro obregón, agencia de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
35	FIII/094/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle división del norte, colonia santa maría, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
36	FIII/095/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en privada la paz, tramo entre calle plazuela y calle la paz, agencia municipal de san juan chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
37	FIII/096/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calle juan de la barrera, tramo de calle primero de mayo a calle niño artillero, barrio santa anita parte media, agencia municipal de san juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano




INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

No.	Número de Obra	Nombre de la Obra
38	FIII/097/2024	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el jardín de niños "prof. Gustavo b. Mendoza" cct.; 20djn2203c, colonia álamos IVO, agencia de policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
39	FIII/099/2024	Construcción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, calle Ejutla, colonia estado de Oaxaca, agencia municipal de san Martín Mexicapam de cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
40	FIII/100/2024	Construcción de guarniciones y banquetas con concreto hidráulico en avenida la magueyera, paraje la magueyera, agencia municipal de trinidad de viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
41	FIII/103/2024	Construcción de alumbrado público con paneles solares, diferentes calles, agencia de policía de san Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
42	FIII/104/2024	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en avenida quinta las águilas, agencia de policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
43	FIII/105/2024	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Benito Juárez, agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
44	FIII/106/2024	Rehabilitación de calles dentro de las zonas de atención prioritaria en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca
45	FIII/107/2024	Rehabilitación del parque público jardín Morelos, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
46	RF/007/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario agencia de cinco señores calle prolongación de colón, agencia de policía de cinco señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


Elaboró
Ing. Giovanni Chávez Daniel
jefe de Departamento de
Construcción de Obra Contratada



Autorizó
Arq. Luis Cabrera Vásquez
Director de Obras Públicas y
Mantenimiento




Vo. Bo.
Ing. Carlos Facundo Alcocer Pérez
Secretario de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano






INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025


REPORTE FOTOGRÁFICO

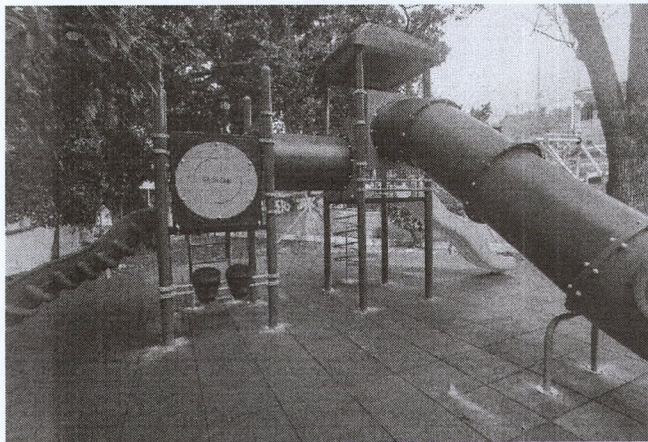

* REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO JARDIN MORELOS, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

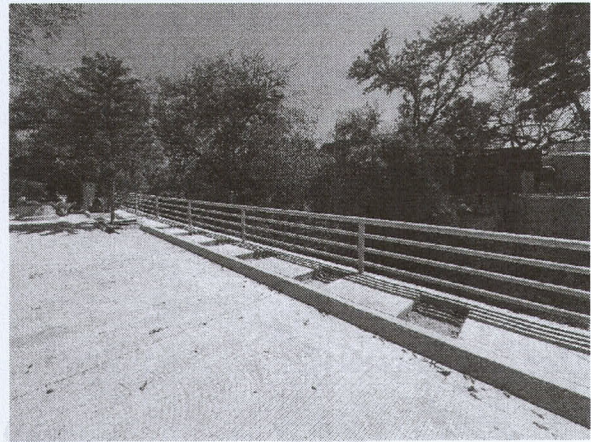

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 3, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

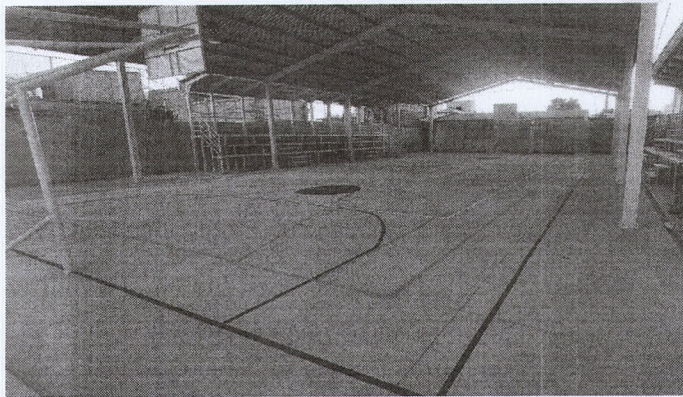

REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" CON C.C.T. 20DPR0315J, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LAS CANCHAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6, CLAVE 20DST0086S, BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS NO. 300, BARRIO DE JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

Elaboró


Ing. Giovanni Chávez Daniel
jefe de Departamento de
Construcción de Obra Contratada



PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD
2025-2027
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE
OBRA CONTRATADA
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Autorizó


Ard. Luis Cabrera Vásquez
Director de Obras Públicas y
Mantenimiento



PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD
2025-2027
SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Vo. Bo.

Ing. Carlos Facundo Alcocer Pérez
Secretario de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano



PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD
2025-2027
SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027



INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

UNIDAD RESPONSABLE	303. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22. Seguimiento y Control de Obra Pública	
COMPONENTE	2. Supervisión y conclusión de la obra pública municipal.	VALOR
ACTIVIDAD	2.2 Conclusión de la obra pública municipal.	2%
INDICADOR	Porcentaje de obras públicas que fueron concluidas.	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y EVIDENCIAS:

En el primer trimestre de este ejercicio se concluyeron un total de 46 obras, su ejecución fu concluida conforme a los lineamientos establecidos en el proyecto original, garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados en términos de infraestructura, funcionalidad y beneficio social.

Durante el proceso de construcción, se llevaron a cabo supervisiones constantes para asegurar la calidad de los materiales, el cumplimiento de los plazos establecidos y la correcta aplicación de los recursos públicos. Gracias a este seguimiento, la obra fue finalizada dentro del tiempo programado y con los estándares requeridos.

La entrega de la obra representa una mejora significativa para la comunidad, impactando positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Se han cumplido las especificaciones técnicas y normativas, asegurando su operatividad y durabilidad a largo plazo.

LISTADO

No.	Número de Obra	Nombre de la Obra
1	FIII/008/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle quinta oriente, colonia Cuauhtémoc, agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez,
2	FIII/009/2024	Rehabilitación de la red de agua potable, calle quinta oriente, colonia Cuauhtémoc, agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez
3	FIII/016/2024	Construcción de andador, Rehabilitación de drenaje, agua potable y muro de contención, andador 4a. privada de Belém, colonia Heladio Ramírez López, agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
4	FIII/017/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, agencia de policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
5	FIII/018/2024	ampliación de red de agua potable en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, agencia de policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
6	FIII/019/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, agencia de policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano





INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

No.	Número de Obra	Nombre de la Obra
7	FIII/023/2024	Construcción de red de drenaje sanitario de la privada sin nombre, colonia insurgentes, agencia municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
8	FIII/033/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la agencia de municipal de San Martín Mexicapam de cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
9	FIII/043/2024	Rehabilitación de barda perimetral, escuela primaria 20 de noviembre clave 20dpr0321u, agencia de policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
10	FIII/044/2024	Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle mercurio, colonia estrella, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
11	FIII/045/2024	Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas, calle rayando el sol, colonia estrella, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
12	FIII/047/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle h. ayuntamiento, colonia 9 de mayo, agencia municipal de pueblo nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
13	FIII/048/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle 15 de junio, colonia 9 de mayo, agencia municipal de pueblo nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
14	FIII/052/2024	Construcción de cisterna de 200,000 litros con captación de aguas pluviales en la agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
15	FIII/055/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle 3° priv. palmas, agencia de policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
16	FIII/056/2024	Rehabilitación de agua potable, calle 3° priv. de palmas, agencia de policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
17	FIII/057/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20djn0645k, agencia de policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
18	FIII/058/2024	Construcción de drenaje sanitario, calle sin nombre perpendicular a libramiento norte, agencia municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
19	FIII/060/2024	Rehabilitación de calle con pavimento de concreto hidráulico, calle Morelos, barrio la soledad, agencia municipal de San Martín Mexicapam de cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
20	FIII/062/2024	Rehabilitación del drenaje calle de colón desde Iturbide hasta calle hierbabuena, agencia municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
21	FIII/064/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle san juan de la granja, colonia casa blanca, agencia municipal de San Martín Mexicapam de cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
22	FIII/065/2024	Construcción y conexión de la red de drenaje sanitario en calle galeana, tramo de calle niño artillero a carretera a Monte Albán, agencia municipal de san juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
23	FIII/066/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la agencia de municipal de san juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano





INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

No.	Número de Obra	Nombre de la Obra
24	FIII/067/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Venustiano Carranza, colonia presidentes de México, agencia municipal de pueblo nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
25	FIII/070/2024	Construcción de muro de contención en calle sabino esquina constitución, sector uno, segunda sección, agencia de policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
26	FIII/071/2024	Construcción de cisterna de 120,000 litros para captación de aguas pluviales en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con cc.t. 20dpr035j, agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
27	FIII/073/2024	Construcción de un módulo sanitario de baños en el jardín de niños "maría del Carmen Millán" con c.c.t 20djn0112y, agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
28	FIII/076/2024	Rehabilitación de cancha deportiva y Construcción de gradas en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con c.c.t. 20dpr0315j, agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
29	FIII/081/2024	Construcción de muro de contención en la calle encinos, colonia reforestación, agencia municipal de pueblo nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
30	FIII/083/2024	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico, tercera privada de Narciso Mendoza, agencia de policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
31	FIII/088/2024	Construcción de espacio multideportivo, calle periférico s/n, agencia municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
32	FIII/089/2024	Rehabilitación del campo de futbol a unidad deportiva 1º de mayo, agencia municipal de san Felipe del agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
33	FIII/092/2024	Construcción de techado de las canchas en escuela secundaria técnica no. 6, clave 20dst0086s, boulevard Eduardo Vasconcelos no, 300, barrio de jalatlaco, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
34	FIII/093/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Álvaro obregón, agencia de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
35	FIII/094/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle división del norte, colonia santa maría, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
36	FIII/095/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en privada la paz, tramo entre calle plazuela y calle la paz, agencia municipal de san juan chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
37	FIII/096/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calle juan de la barrera, tramo de calle primero de mayo a calle niño artillero, barrio santa anita parte media, agencia municipal de san juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano





INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2025

No.	Número de Obra	Nombre de la Obra
38	FIII/097/2024	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el jardín de niños "prof. Gustavo b. Mendoza" cct.; 20djn2203c, colonia álamos IVO, agencia de policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
39	FIII/099/2024	Construcción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, calle Ejutla, colonia estado de Oaxaca, agencia municipal de san Martín Mexicapam de cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
40	FIII/100/2024	Construcción de guarniciones y banquetas con concreto hidráulico en avenida la magueyera, paraje la magueyera, agencia municipal de trinidad de viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
41	FIII/103/2024	Construcción de alumbrado público con paneles solares, diferentes calles, agencia de policía de san Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
42	FIII/104/2024	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en avenida quinta las águilas, agencia de policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
43	FIII/105/2024	Rehabilitación de red de agua potable en la calle Benito Juárez, agencia de policía de dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
44	FIII/106/2024	Rehabilitación de calles dentro de las zonas de atención prioritaria en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca
45	FIII/107/2024	Rehabilitación del parque público jardín Morelos, cabecera municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
46	RF/007/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario agencia de cinco señores calle prolongación de colón, agencia de policía de cinco señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


Elaboró

Ing. Giovanni Chávez Daniel
jefe de Departamento de
Construcción de Obra Contratada




Autorizó

Arq. Luis Cabrera Vásquez
Director de Obras Públicas y
Mantenimiento



Vo. Bo.

Ing. Carlos Facundo Alcocer Pérez
Secretario de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano



Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
